




ESC N° 534 Republica de Bolivia

Mejoramiento de veredas

CURVA DE INVERSIONES Y DE AVANCE DE OBRA

Inicio de obra	antipico 15/9/2025	15/10/2025	15/11/2025	30/11/2025
Inicio de obra	Medición 1	Medición 1	Medición 2	Medición 3
0,00%	15,00%	18,88%	71,54%	100,00%
0,00%				

Previsto
Real

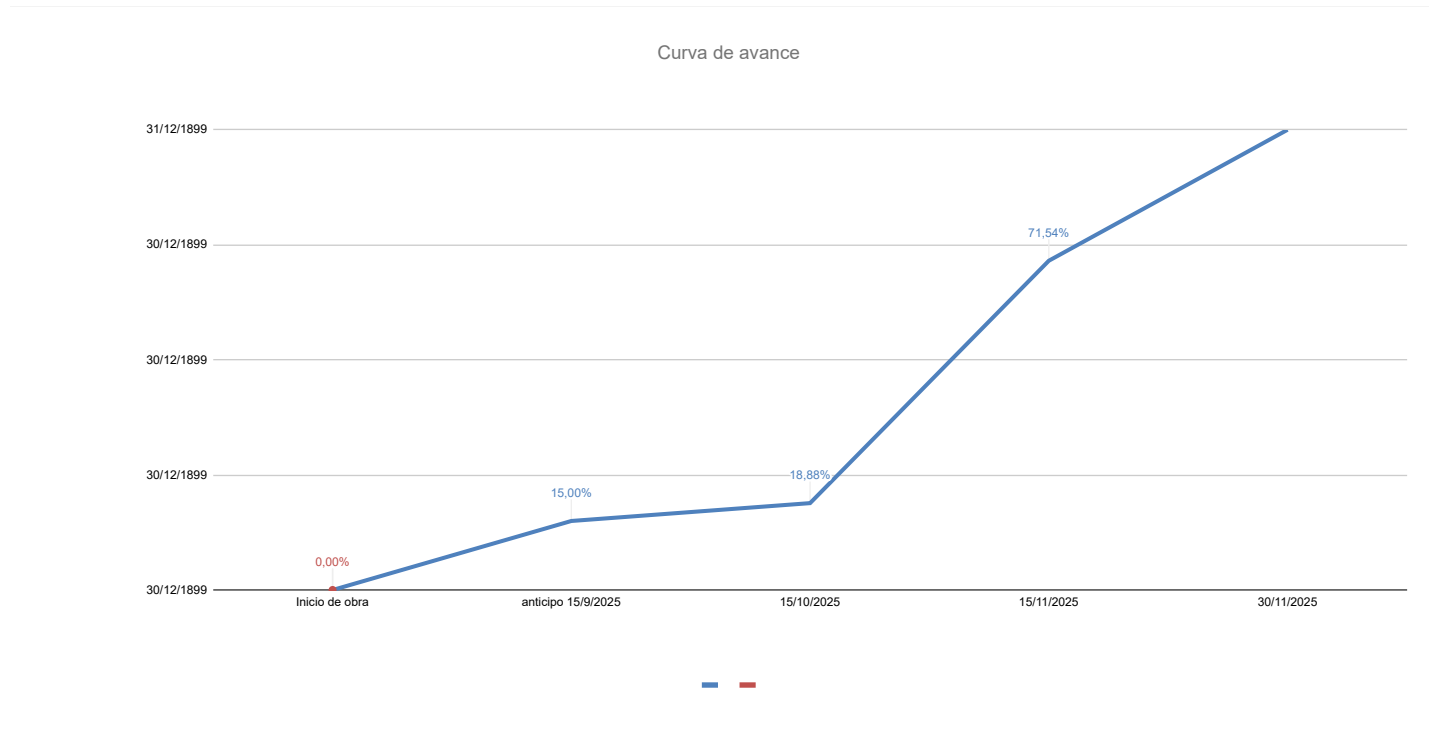

Contratista: Representante Técnico

Dirección de Obra
