Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

ESC N° 637 E.E.S. Domingo Cullen

Mejoramiento de veredas

CURVA DE INVERSIONES Y DE AVANCE DE OBRA

Inicio de obra	anticipo 18/8/2025	18/8/2025	30/9/2025	1/10/2025	
Inicio de obra	Medición 1	Medición 1	Medición 2	Medición 3	
0,00%	15,00%	42,16%	83,20%	100,00%	Previsto
0,00%					Real

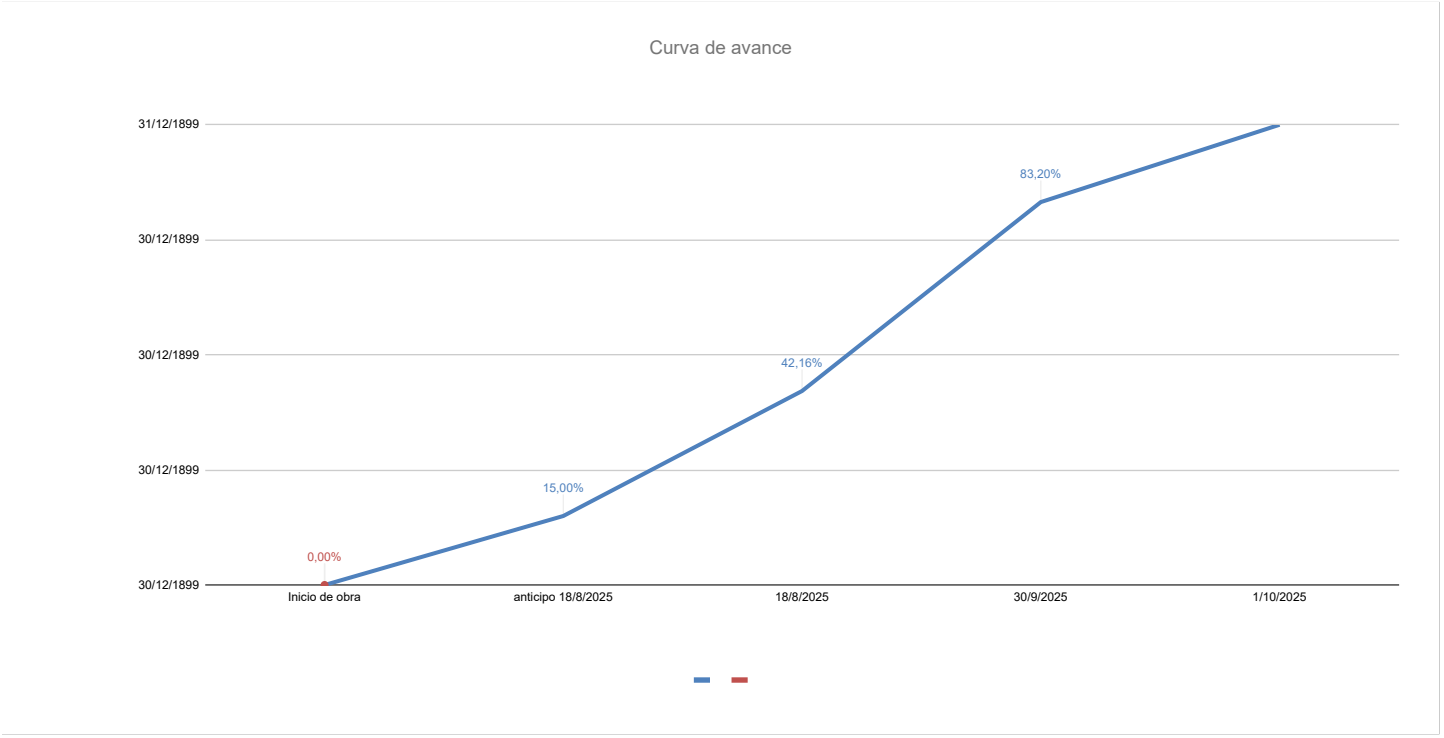

Contratista: Representante Técnico

Dirección de Obra
